

Santiago de Cali, 15 de noviembre de 2023

Doctor  
**Fernando Céspedes Martínez**  
Gerente General  
IMPRETICS E.I.C.E.  
Ciudad

IMPRETICS E.I.C.E. Rad. CI2023000044  
2023-11-15 13:55  
Anexos: 01 - Folios 14



ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO  
PROYECTOS DE REGALÍAS  
REMITE: IMPRETICS E.I.C.E.  
REMITENTE: JORGE PIEDRAHITA - SUBGERENCIA  
DESTINATARIO: FERNANDO CESPEDES - GERENCIA  
RADICADA: CLAUDIA MEJIA CARDENAS

Ref. **INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO PROYECTOS DE REGALÍAS**

Reciba un cordial saludo,

Respectado Doctor.

Me permito enviar el informe final de seguimiento al proceso de proyectos de regalías correspondiente al periodo 2023.

Se recomienda revisarlo y considerar las recomendaciones dadas.

Agradecemos comunicar cualquier inquietud al correo institucional [controlinterno@impretics.gov.co](mailto:controlinterno@impretics.gov.co)

Cordialmente,

JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ  
Oficina de Control Interno

Copia a. Archivo



## INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALÍAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 1 de 13

FECHA DE  
EMISIÓN DEL  
INFORME

Día:

14

Mes:

11

Año:

2023

<b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>	Proceso Comercial y de Producción
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Luz Stella Betancourt – Subgerente Comercial y de Producción.
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Evaluar el estado de los proyectos financiados con recursos del SGR y que han sido asignados a la entidad en calidad de ejecutor o interventoría, así como evaluar el cargue oportuno en la plataforma GESPROY por parte del proceso encargado de IMPRETICS E.I.C.E. en cumplimiento del Artículo 53 de la Ley 2195 de 2023.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Todos los Proyectos de Regalías en proceso de contratación, ejecución y cierre a la fecha ejecutados y/o operados por IMPRETICS.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	Requisitos legales: <ul style="list-style-type: none"><li>• Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia</li><li>• Ley 1530 de 2012</li><li>• Ley 2056 de 2020</li><li>• Ley 1923 de 2018</li><li>• Sistema General De Regalías - <a href="https://www.sgr.gov.co">https://www.sgr.gov.co</a></li></ul>
<b>Metodología:</b>	Se solicitó al proceso de regalías la información sobre los proyectos de regalías en fase de contratación, ejecución y cierre a la fecha, teniendo en cuenta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Listado detallado código BPIN y nombre de los proyectos.</li><li>• Información del estado de cada uno de los proyectos.</li><li>• Fuentes de Financiación.</li><li>• Valor de cada proyecto informado</li><li>• Avance físico y financiero de cada proyecto informado.</li></ul>



## INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 2 de 13

- Fecha de cierre planeado en cada proyecto informado.

<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
Jorge Arley Piedrahita	

## RESUMEN DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno en ejercicio de su función de Evaluación Independiente y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2023, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, incluyó la realización del seguimiento a Proyectos de Regalías. Este consiste en el desarrollo de un proceso de verificación y observación de este proceso por parte del área de regalías, área responsable del seguimiento a los proyectos, así como del cargue en la plataforma GESPROY, entre otros.

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta el seguimiento anual a la ejecución de proyectos con Recursos del Sistema General de Regalías por parte de la Oficina de Control Interno.

El área de regalías de IMPRETICS E.I.C.E. a la fecha de realización del presente seguimiento reportó a esta oficina la ejecución actual de 8 proyectos de los cuales en 5 la entidad cumple el rol de ejecutor y en 2 la entidad cumple el rol de la interventoría.

#	BPIN Proyecto	Nombre del Proyecto	Estado actual de ejecución	Fuentes de Financiación	Valor del Proyecto	Avance Físico	Avance Financiero	Fecha de Cierre planeado
1	2017000100042	Incremento de la innovación para las empresas de Economía Naranja del Valle del Cauca	Actualmente el proyecto se encuentra terminado y en proceso de cierre	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología	\$ 6.564.945.098	95,27%	96,62%	30 de noviembre del 2023





INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 3 de 13

				E Innovación				
2	2018000100059	Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro de Neurociencia Clínica y Comportamiento Valle del Cauca	El proyecto se encuentra terminado y se esperan las acciones del ejecutor (Universidad del Valle) para el cierre del proyecto. IMPRETICS E.I.C.E. contrató la interventoría del proyecto y el contrato ya se encuentra liquidado.	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	\$ 3.447.991.294	94,47%	95,07%	30 de noviembre del 2023
3	2017000100041	Implementación de un sistema integral de gestión del conocimiento y apropiación social de la CTel que promueva soluciones de Vivienda Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Cerrado	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	\$ 4.650.400.000	100%	100%	28 de febrero del 2023



INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 4 de 13

4	2018000100096	Investigación y desarrollo experimental de un modelo sostenible de generación de Biocombustibles y productos de valor agregado a partir de residuos agrícolas y agroindustriales (biomasa residual) en la industria porcícola en el Valle del Cauca	Contrato en Ejecución	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	\$ 3.810.390.820	99,20%	99,32%	Noviembre 30 del 2023
5	2018000100098	Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del Cauca	Terminado en proceso de cierre	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	\$15.000.000.000	100%	100%	Noviembre 30 del 2023
6	2021000100196	Fortalecimiento de la competitividad empresarial mediante el uso de las CTel como herramienta	El proyecto se encuentra terminado en actividades, está en proceso por	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	\$ 5.125.000.000	97,56%	97,56%	Diciembre 30 del 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 5 de 13

		transversal de desarrollo en el departamento del Valle del Cauca	parte de la interventoría de revisión de informes finales, liquidación de contrato y cierre del proyecto					
7	2022000100113	Fortalecimiento de capacidades de innovación para el aumento de la competitividad y el desarrollo social en el departamento del Valle del Cauca	Contrato en Ejecución con avance en las actividades contratadas.	Sistema General de Regalías – Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	\$ 5.348.000.000	45,75%	54,95%	30 de octubre del 2024
8	2022002880003	Implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micro negocios y unidades productivas en San Andrés	Contrato en Ejecución con avance en las actividades contratadas.	Sistema General de Regalías - Asignación para la inversión regional 60%	\$14.999.277.182	95,74%	94,35%	30 de junio del 2024

La entidad reporta que 6 proyectos se encuentran en ejecución, 1 se encuentra en la fase de terminación **BPIN 2018000100098 Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del Cauca**, y otro se encuentra en la fase de cierre que corresponde al **BPIN 2017000100041 Implementación de un Sistema Integral de Gestión del**





INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 6 de 13

**Conocimiento y Apropiación Social de la CTEL que Promueve Soluciones de Vivienda en el Departamento del Valle del Cauca.**

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno pudo verificar que la información suministrada por el área corresponde a la información reportada en la plataforma tecnológica creada por el Departamento Nacional de Planeación para las entidades ejecutoras con el fin de que gestionen los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en tiempo real denominada GESPROY SGR obteniendo los siguientes resultados.

Proyecto: **“Incremento de la Innovación para las Empresas de Economía Naranja del Valle del Cauca”**  
BPIN 2017000100042

**Alcance**

Aumentar los niveles de Innovación en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector de la Economía Naranja en el Valle del Cauca

Fecha aprobación

Fecha remisión

Estado

21/10/2019

31/03/2023

**CONTRATADO EN  
EJECUCIÓN**

Valor total

Valor SGR

Probado directamente

\$ 6.564.945.098

\$ 6.564.945.098


No

\*Difas en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[Histórico Estados](#)

**Línea de tiempo de ejecución del proyecto**

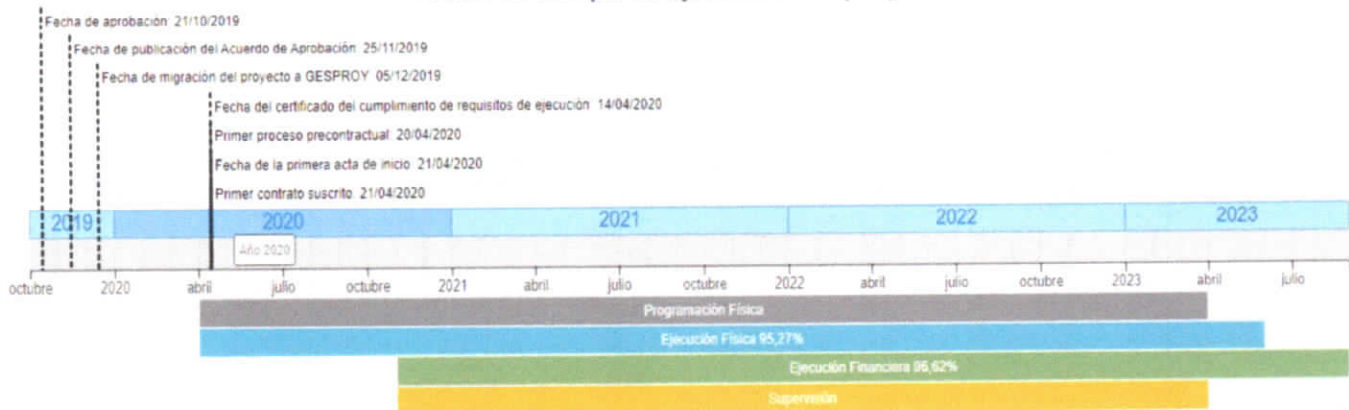



INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 7 de 13

Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 95,27%
- Ejecución financiera: 96,62%

Proyecto: "Estudio de Prefactibilidad para la Creación de un Centro de Neurociencia Clínica y Comportamental Del Valle Del Cauca" BPIN 2018000100059

Alcance

Elaborar los estudios de viabilidad técnica para la investigación de enfermedades neuropsiquiátricas en el Valle del Cauca (5 documentos: Caracterización epidemiológica, Referenciación Centros de Investigación, Agenda de investigación, Plan estratégico, Modelo Financiero) y Realizar los estudios físicos, técnicos, legales y ambientales y de sostenibilidad para la construcción de la infraestructura adecuada para la investigación en enfermedades neuropsiquiátricas (4 estudios de preinversión)

Fecha aprobación:

29/11/2019

Fecha terminación:

30/11/2022

Estado:

**CONTRATADO  
EN EJECUCIÓN**

Valor total:

\$ 3.447.991.294

Valor SGR:

\$ 3.331.491.294

Aprobado directamente


No

\* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

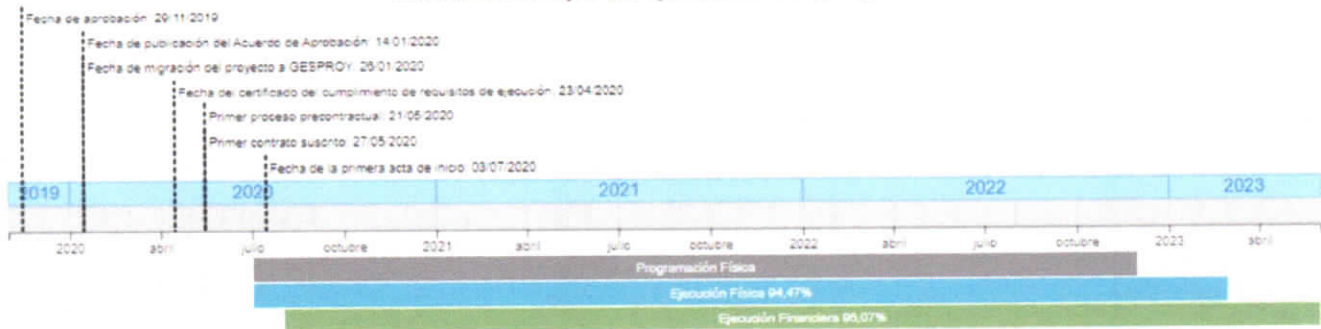

Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 94,47%
- Ejecución financiera: 95,07%





INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 8 de 13

Proyecto: "Investigación y Desarrollo Experimental de un Modelo Sostenible de Generación de Biocombustibles y Productos de Valor Agregado a Partir de Residuos Agrícolas y Agroindustriales (Biomasa Residual) en la Industria Porcícola en el Valle del Cauca" BPIN 2018000100096

Alcance

Generar nuevo conocimiento de alternativas para el aprovechamiento integral de los residuos en la industria porcícola del Valle del Cauca a través Artículos de investigación (9), congresos y capacitaciones (8), modelos documentados (3) y estudios de licenciamiento (2)

Fecha aprobación

Fecha terminación

Estado

21/10/2019

30/04/2023

CONTRATADO  
EN EJECUCIÓN

Valor total

Valor SGR

Aprobado directamente

\$ 3.810.390.820

\$ 2.583.950.591


No

\* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

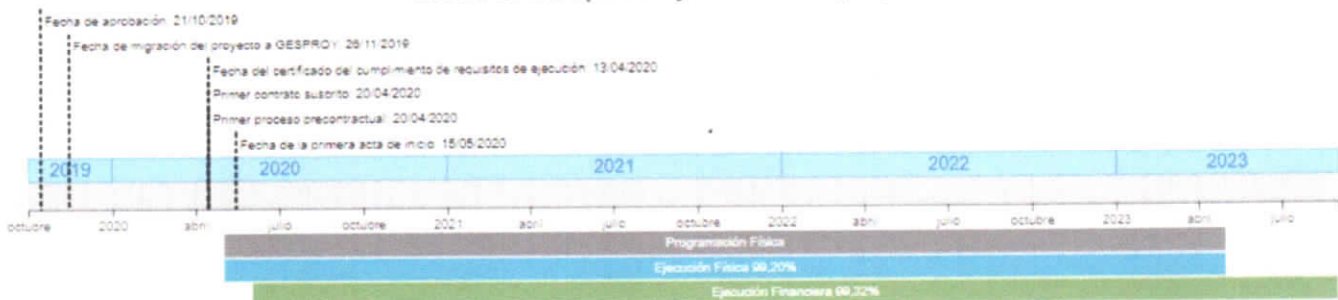

Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 99,20%
- Ejecución financiera: 99,32%



INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 9 de 13

Proyecto: "Desarrollo de Capacidades de Innovación en las Empresas para Aumentar la Competitividad y Productividad del Departamento del Valle del Cauca" BPIN 2018000100098

**Alcance**

Financiar 100 Mypimes del Departamento del Valle del Cauca para incorporar proyectos de innovación en cierre de brechas tecnológicas para impactar el IDC Nacional con respecto al Departamento.

Fecha aprobación:

29/11/2019

Fecha terminación:

30/01/2023

Estado:

**TERMINADO**

Valor total:

\$ 15.000.000.000

Valor SGR:

\$ 15.000.000.000

Aprobado directamente <sup>1</sup>


No

\* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

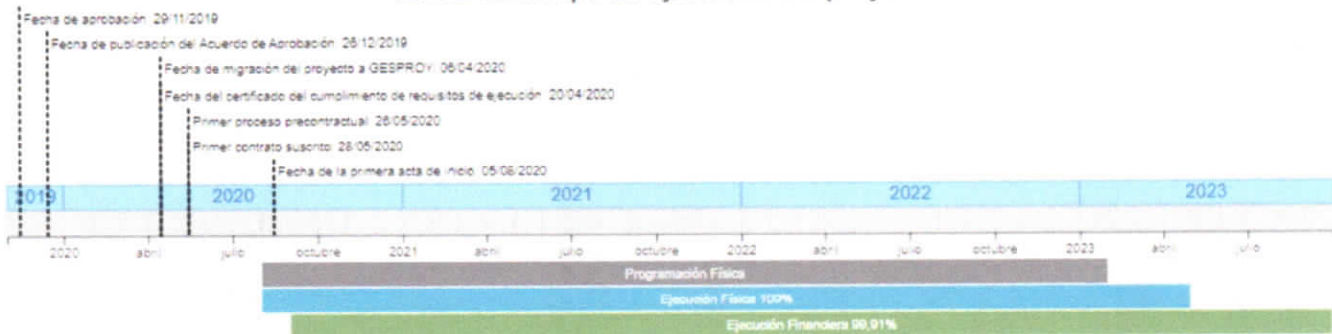

Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 100%
- Ejecución financiera: 99,91%
- A la fecha el estado de este proyecto está TERMINADO



INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 10 de 13

Proyecto: "Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial Mediante el Uso de las CTEI como Herramienta Transversal de Desarrollo en el Departamento del Valle del Cauca" BPIN 2021000100196.

Alcance

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  
MEDIANTE EL USO DE LAS CTEI COMO HERRAMIENTA TRASVERSAL  
DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha aprobación

Fecha terminación

Estado

30/12/2021

03/12/2023

CON  
EN E

Valor total

Valor SGR

Aprobado

\$ 5.125.000.000


\$ 5.000.000.000

\* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[Histó](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

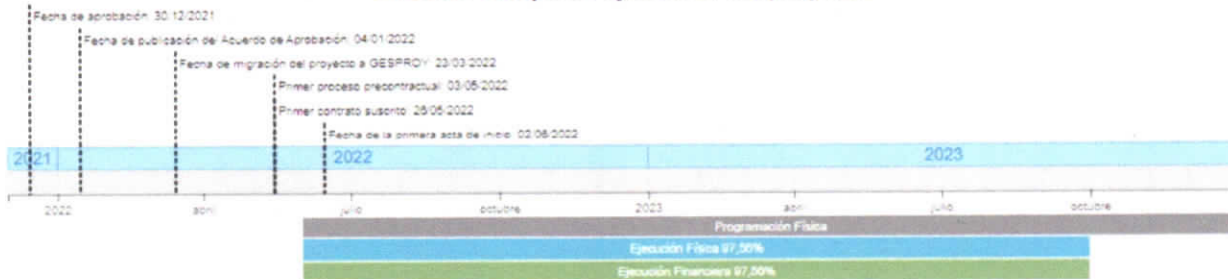

Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 97,56%
- Ejecución financiera: 97,56%





INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 11 de 13

Proyecto: "Fortalecimiento de Capacidades de Innovación para el Aumento de la Competitividad la Productividad y el Desarrollo Social en el Departamento del Valle del Cauca" BPIN 2022000100113

**Alicance**

Aumentar las capacidades de innovación en el tejido empresarial del Departamento del Valle del Cauca

Fecha aprobación

Fecha terminación

Estado

19/12/2022

29/02/2024

**CONTRATADO  
EN EJECUCIÓN**

Valor total

Valor SGR

Aprobado directamente ⓘ

\$ 5.348.000.000

\$ 5.000.000.000


No

\* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)

[Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

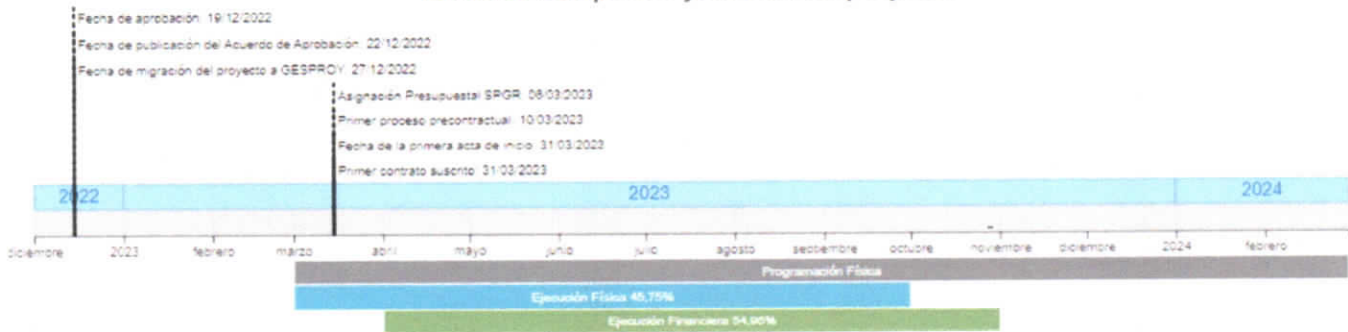

Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 45,75%
- Ejecución financiera: 54,95%



## INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 12 de 13

Proyecto: "Implementación de una Estrategia de Reactivación Económica para el Progreso y la Competitividad de Micronegocios y Unidades Productivas en San Andrés" BPIN 2022002880003

**Alcance**

Implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micronegocios y unidades productivas en San Andrés

Fecha aprobación

22/04/2022

Fecha terminación

17/12/2023

Estado

**CONTRATADO  
EN EJECUCIÓN**

Valor total

\$ 14.999.277.182

Valor SGR

\$ 14.999.277.182


Aprobado directamente

No

\* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#)[Histórico Estados](#)

## Línea de tiempo de ejecución del proyecto

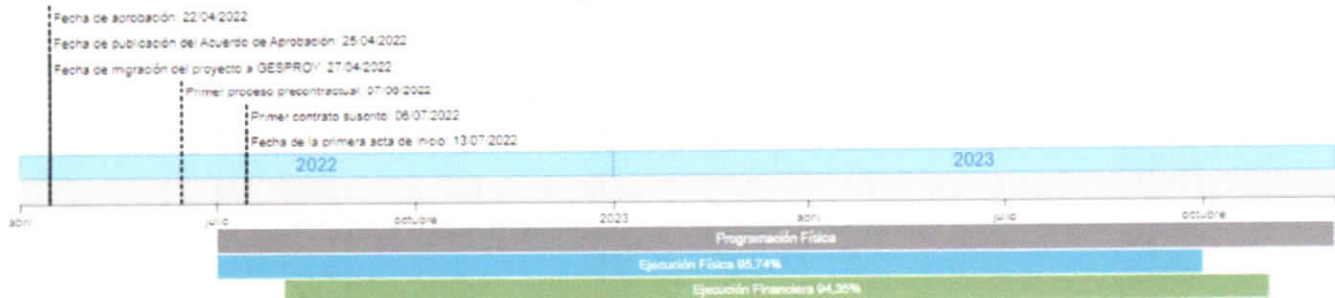

## Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 95,74%
- Ejecución financiera: 94,35%



## INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE REGALIAS

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 13 de 13

**CONCLUSIONES**


De acuerdo con las observaciones identificadas durante el ejercicio de verificación y seguimiento al reporte de la información a la plataforma GESPROY de los proyectos de regalías, se concluye que es de vital importancia cumplir con las fechas estipuladas de cierre, así como cumplir con los cronogramas de ejecución de cada uno de ellos.

El nivel de ejecución de recursos de los proyectos de inversión asociados del SGR, ha sido adecuado en lo corrido del año, lo cual se encuentra acompañado por el cumplimiento de las metas propuestas, sin denotarse retrasos que impacten negativamente el cumplimiento de las mismas.

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda establecer mecanismos de verificación y validación de la ejecución física reportada mensualmente de cada uno de los proyectos de regalías ejecutados por la entidad.
- Se recomienda que el servidor público y/o contratista encargado del proceso de proyectos de regalías cumplan con la normatividad vigente para la publicación de la información en la plataforma GESPROY y de manera oportuna.
- Se recomienda publicar en la página web de la entidad, información técnica de los proyectos, su avance físico y financiero, así como mecanismos de contacto para que la ciudadanía pueda solicitar información sobre el proyecto de su interés.

**RESPONSABLES:**

AUDITOR LÍDER	APROBADO POR	
NOMBRE	NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO	CIUDAD Y FECHA INFORME
 Dr. Jorge Arley Piedrahita Rodríguez	Dra. Luz Stella Betancourt	Cali, noviembre 14 de 2023
